

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

III

1. Obiekt zabytkowy

Odb. XX w.

Kamienica,

MARIACKA 42

2. Miejscowość

GDAŃSK-GL.M.

MIASTO

3. Wiek

XVII

4. Styl

Barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2000

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 129

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

polskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

3,5

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

c) piwnic

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk

1,5

b) autobusowa

—

1

22. Właściciel i jego adres

Prez. MRN w Gdańsku  
Swierczewskiego 8-10

23. Użytkownik i jego adres

Dz. ZBM Dł. Targ 1-7

24. Inwestor i jego adres

DBOR Dł. Targ 39-40

8. Wyposażenie architektoniczne

przed zniszczeniem - elementy frontowe z tenduszu bogato zdobionym drewnem - wnętrza drewniane, portale i przedproże

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j. kr.

17. Użytkowanie obecne

j. kr.

18. Nadaje się do użycia na

j. kr.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud.: ok. 1650 r.  
odb.: 1956 r., 1965 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1955

1956

1965

spalony

wielkie zniszczenia restok

odbudowa na zniszczonym miejscu

z rekonstrukcyjnymi elementami frontowymi

portali i przedproża (złoty stan sprawy)

1965 odbudowa zakończona z wyjątkiem przedproża

85

100

90

25. Rejestr zabytku Nr

583

rok

20 x 472

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

dostępny



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

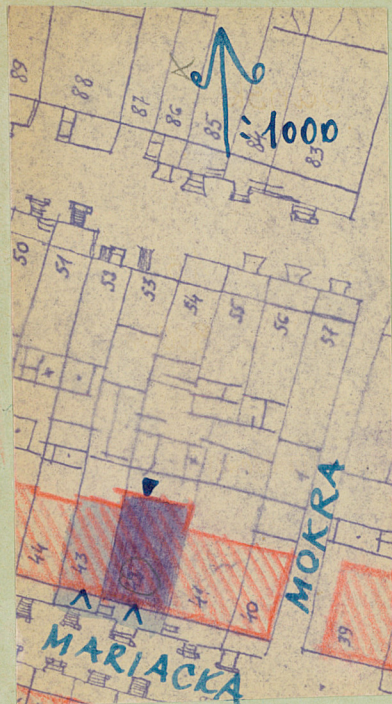

El. frontowa



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

El. tylna



Roboty elewacyjne  
zakończono w r. 1963

36. Wypełnił dnia 25 listop. 1959

R. Marabki J. Jankowski

37. Sprawdził dnia

II. 1965 Strzelecka  
Dłokryńska
