

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WIELKOPOLSKIE

3444

1. Obiekt zabytkowy

POZA
SPISOM

DOM ul. Rakoniewicka 4

2. Miejscowość

GRODZISK

3. Wiek

XIX

4. Styl

regionalny

5. Kubatura m³

705,25

6. Powierzchnia w m²

100,75

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

6

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

podwoje

120m²

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

starostwo

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

biuro

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

mieszkalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany ok. poł. XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

dach i strop

XI.1939 r.

mieszkalny

XII.1945 r.

"

1957

remont

IX.1959

Stan techn. budynku dobry (po remon-
cie)

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

POZNANSKIE

WOJEWÓDZTWO

POZNAN

GRODZISK

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

GRODZISK

1,3

b) autobusowa

- - -

50m

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

- - -

25. Rejestr zabytku Nr

brak

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny


28. Akta

brak

29. Fotografie Archiwum WKZ Poznań

30. Inwentaryzacja pomiarowa

brak

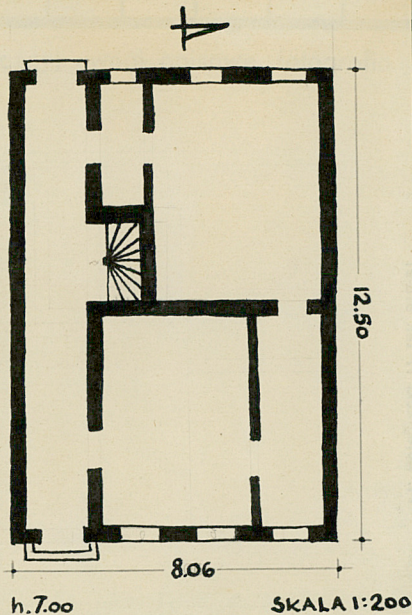

Opis: Ustawiony kalenicowo. Murowany, otynkowa-
ny. Piętrowy, częściowo podpiwniczony. Dwu-
traktowy, czteroosiowy z sienią przelotową
z boku. Konektygnacje rozdzielone pasem
kordelkowym. Dach dwuspadowy kryty
dachówką.

Bibliografia:

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959

Bednarz

37. Sprawdził dnia IX. 1965

[Signature]
