

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. P.W. ŚW. FLORIANA

2. Miejscowość

DOMANIEW

gm. DAWKÓW

3. Wiek XVI

4. Styl GOTYK

5. Kubatura m³

6800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 410

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ŁÓDZKIE

b) powiat

PODDEBICKI

c) gmina

DOMANIEW

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

1/4 ha

a) kolejowa

PODDEBICE

7 km

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

b) autobusowa

BRUDNÓW

d) więzania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

5

d) wody

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA W DOMANIEWIE

e) krycie dachu

DACHÓWKA

c) piwnic

1

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku KOŚCIÓŁ PAR.

23. Użytkownik i jego adres

- II -

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- II -

17. Użytkowanie obecne

- II -

24. Inwestor i jego adres

- II -

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbud. XVI/XVII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

NIE ZNISZCZONY

XI.1939 r.

- II -

XII.1945 r.

- II -

IX.1965

stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

1946-XVII-71

rok

1946/Nr 403 z dn. 3 X. 1967 r.

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

TAK. KLUCZE NA PLEBANII.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

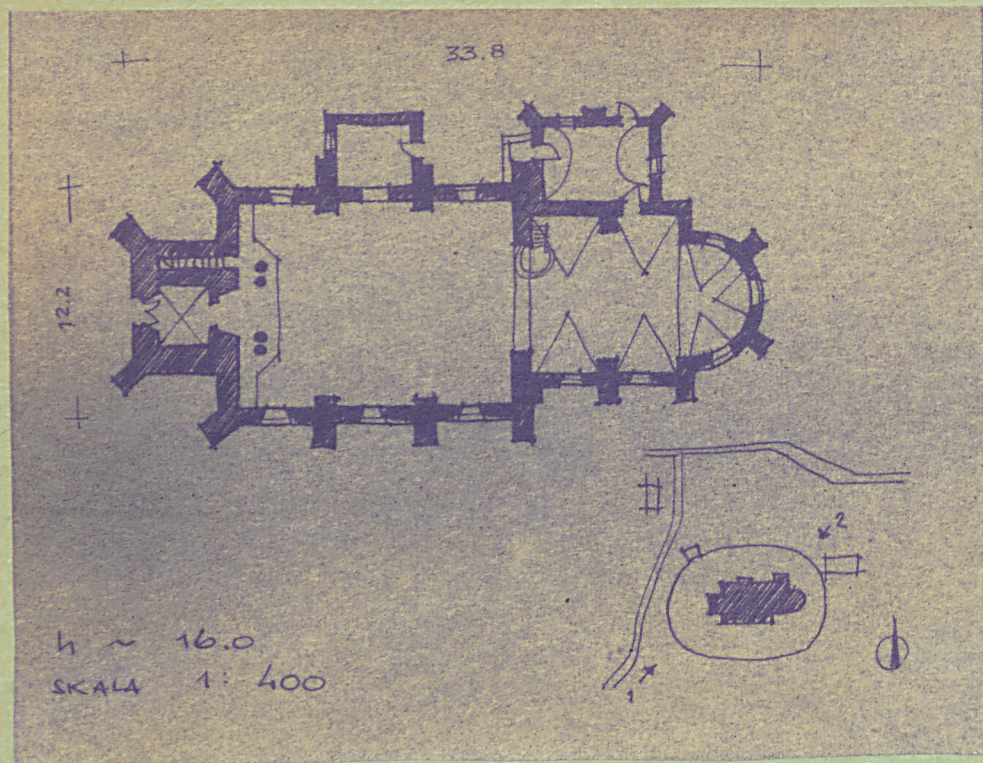

Kościół z XVI w. późnogotycki. Murowany. Orientowany. Na pl. prostokąta, jednonawowy, prezbiterium zamknięte półkolistą apsydą.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

IX. 1965 Inż. arch. JANET DUTKOWSKI

36. Wypełnił dnia 29.X.1959r.

Włodzisław Borek

37. Sprawdził dnia 16.XI.1959

Starszy Konserwator Zabytków

mgr Mieczysław Prociwka
