

2 Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

84113

Spichlerz (granum).

2. Miejscowość Warszawa - Wilanów
ul. Wierbowska

3. Wiek XVIII/XIX

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

4130

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: — b) użytkowa: 2478

20. Przynależność administracyjna

a) województwo M. St. Warszawa

b) powiat —

c) gmina —

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2 poddasza

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

9

b) innych pomieszczeń

10

c) piwnic

6 gospod.

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

—

+

b) autobusowa

—

—

22. Właściciel i jego adres

Rolnicy Zakład Doświadczalny SSSW
Wilanów, ul. Wierbowska 4

8. Wyposażenie architektoniczne

fynki, bez wyposażenia.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

spichlerz.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

spichlerz.

17. Użytkowanie obecne

spichlerz, magazyn owoców, mieszk.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

Zarząd Inwestycji Miast. Szkół Wsi

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII/XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X-1959.

użycie normalne, wilgoć.

20

25. Rejestr zabytku Nr

639/228

rok 1953

Konserv. miejski
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie w zespole gospod.

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schem
1:500

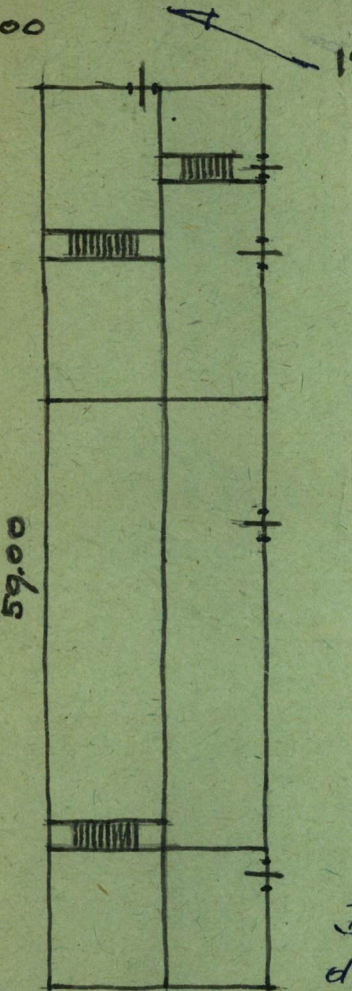

59.00

14.00

ul. Wierzbica 24. Długość 14.00 m. Szerokość 59.00 m. Budynki wolnostojące z przystankiem do ulicy, z dachem czterospadowym i dwupoziomymi murami. Istnieje również cegłownica.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10.11.1959

Złazgier Z. Kocot

37. Sprawdził dnia 9.11.1959

Krasinski

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT
