

Nr II 31

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ ŚW. ILEBIETY

2. Miejscowość

GDAŃSK

MIASTO

3. Wiek XV

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³
5.210,88 4.9006. Powierzchnia w m² 441,6
a) zabytkowa: 407 b) użytkowa: 407

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

gwierzdn.
cegłagwierzdn.
cegła

c) stropy

drewno klejne
zakryte

zakryte

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachów

dachów

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń
kościół + zakrystia

c) piwnic —

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne —

8. Wyposażenie architektoniczne

okna, skarpki z piwnakami

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół przyszpitalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych Kościół paraf. protest.

17. Użytkowanie obecne Kościół paraf. katolic.

18. Nadaje się do użycia na

Kościół.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
ok 1400 - autor nieznany

1846 - restauracja

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

wzmocnienie

XI.1939 r.

—

XII.1945 r.

zniszczenie

60

1947/49

odbudowa i oddanie do użytku

1959

st. dobry

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

w Gdansk

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

W.M

b) autobusowa

W.M

22. Właściciel i jego adres: Skarb Państwa
Kieria Biskupia Oliwa
ul. Cystersów 1

23. Użytkownik i jego adres

O.O. Pallotyński ul. Elzbietańska 1

24. Inwestor i jego adres

Kieria Biskupia
O.O. Pallotyński

25. Rejestr zabytku Nr

388

rok

6.08.71

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie



30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

bez ograniczeń

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

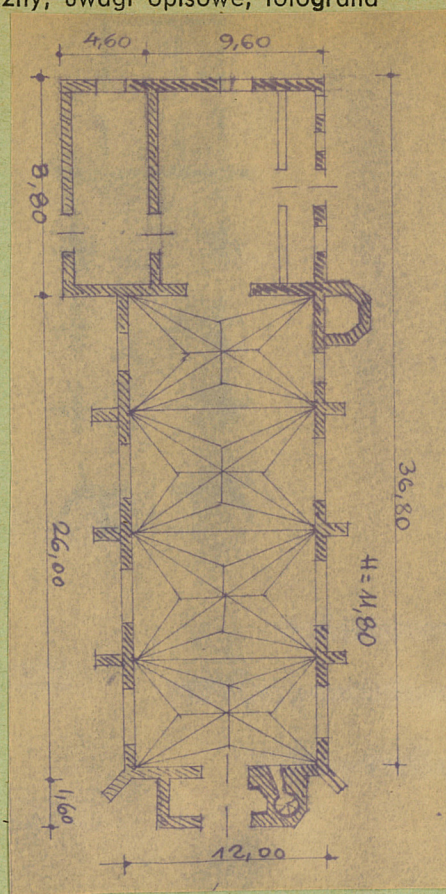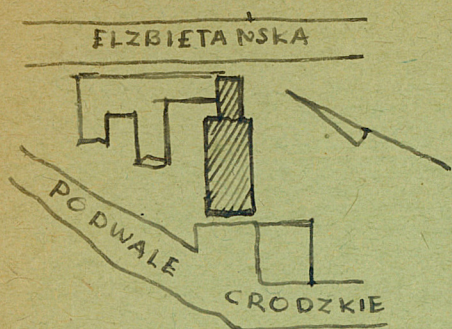

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 20 PAZ 1965
Krzysztof P. Tauszyński

37. Sprawdził dnia 18. 65
[Signature]

