

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1052

1. Obiekt zabytkowy

kaplica rym. kat. p. wezw. św. Antoniego Padewskiego

2. Miejscowość

gm. BRZEŹNO

Peczerzyna

3. Wiek

XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

341

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 68,2 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Koszalin

b) powiat

Świdwin

c) gmina

Brzeźno Św.

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

granit
cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Świdwin

10

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres

parafia rym. kat. Łabędzie

23. Użytkownik i jego adres

—

—

24. Inwestor i jego adres

—

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

kościół należy do pro-wincjonalnej grupy kościo-
-łów o zapóźnionych cechach
gotyko-ren. budowanych w
XVII w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1959

Stan dobry

VIII. 1964

STAN TECHNICZNY DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

488

rok 15.V.65

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie


U.K. Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Klucze w domu prywatnym,
obok kaplicy

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

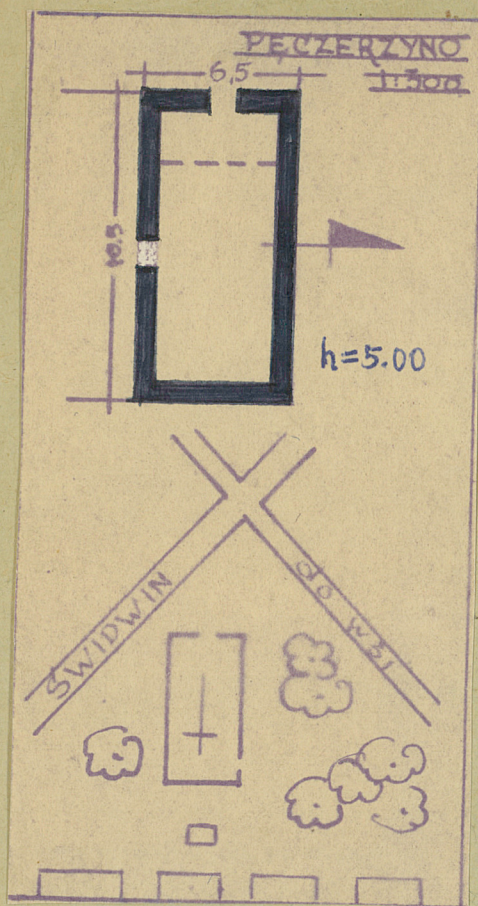

Kościół orientowany, granitowy, nietynkowany, prostokątny, kryty szostkowo. Porzbaniony podziabowi dekoracji. Nad nawą od zach. nadbudowana w licu muru mała drewniana wężyczka sygnaturkowa lukratowa, kryta namiotową oszalowana poprzecznie. Otwory wejściowe i okienne ostrołukowe, profilowane, we wnętrzu strop belkowy.

Zjednoczenie - sam. 1955, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia - J. Kothe - Die Kreise Schivelbein, Dramburg.

36. Wypełnił dnia XI. 1959

A. Przerepiński

37. Sprawdził dnia 19. VIII. 1964

MGR J. PTASZYŃSKA
INŻ. F. PTASZYŃSKI
