

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ par. p.w. Nawiedzenia N.P. Marii

2. Miejscowość

BIELAWY

gm. BIELANY

3. Wiek

XV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

6020

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 720 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

c) piwnic

1/2

e) inne

cmentarz

1/2

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KODZKIE

b) powiat KOWICKI

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Stowino

12

b) autobusowa

Bielawa

—

22. Właściciel i jego adres

Adm. Kościoła Rygm. Nat.

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Kościoła p.w. Nawiedzenia N.P. M.

24. Inwestor i jego adres

Jan p. 23

25. Rejestr zabytku Nr 94-VI-3

rok 1946 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

P. I. S. w W-mie D116

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z. A. P. Politechniki w - skieg
P. I. S. w W-mie m. 36 z 1928

8. Wyposażenie architektoniczne

mystroj z wieków XVI, XVII, XVIII, XIX

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
X. 1959	w stanie dobrym		
7/66	stan dobry		

9. Autorzy i data budowy i przebudowy


Zbudowany 1 poł. XV w.
rekonstruowany 1898 i 1930 r.
z uzupełnieniem strop, sklepień krytych
i żebrowych w nawach i presbiterium.

10. Udostępnienie

dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

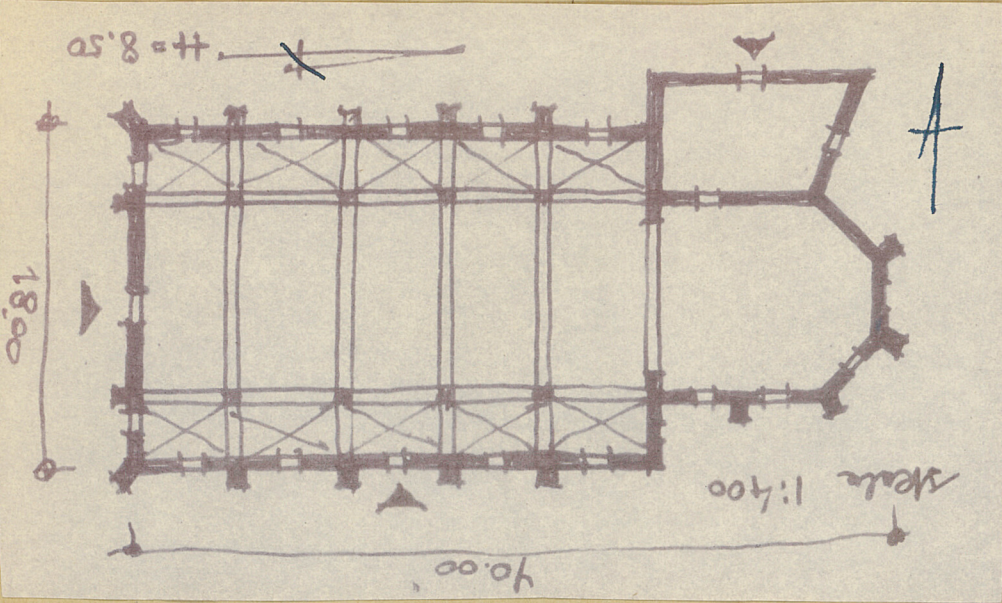

Orientowany, trójnawowy halowy.
Nawy pięcioprzęsłowe. Przekładowe
dwuprzęsłowe zamknięte wielobocznie
przy półn. ścianie prezbiterium, zakryte
arkadami w górnym rzędzie
zachodni wieżowo - sterczynowy,
podzielony licznymi. Dachy dwu-
spadowe. Przy uskoku nady do
prezbiterium na kalenicy sygnu-
lurka.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Mgr inż. arch. DONAT PUTKOWSKI

vii/1966

36. Wypełnił dnia

30. X. 1958 r.

Autograf

37. Sprawdził dnia 16. XI. 1958

Starszy Konserwator Zabytków

li m

(mgr Mieczysław Pracuta)
