

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAŁOPOLSKIE

1000 8194

1. Obiekt zabytkowy

84914

OGRODZENIE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

2. Miejscowość gm. N. Wiśnica-Lipnica
WIŚNICZ (NOWY)

3. Wiek

XVII-XX

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m³

BRAMKA 150

6. Powierzchnia w m² BRAMKA 50

a) zabytkowa: b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ

b) sklepienia

-

c) stropy

-

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

-

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat BOCHNIA

c) gmina WIŚNICZ (NOWY)

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

BOCHNIA

7

b) autobusowa

W/M

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RYM. WAT. W/M

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

OGRODZENIE KAMIEŃNE KRYTE DACHÓWKĄ
BRAMKA KAMIEŃNA Z PRZEJŚCIEM PODKOLISTYM, Z TRÓJKĄTNYM SZCZYTEM ZAKOŃCZONYM W SZCZYTIE KRZYŻEM KAMIEŃNYM I DWOMA KULAMI PO BOKACH
BRAMKA OD STR. ZACH. Z PRZEJŚCIEM OWYKROJU PODKOLISTYM PRZYKRYTĄ ZY

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

OGRODZENIE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

J.W.

17. Użytkowanie obecne

J.W.

18. Nadaje się do użycia na

J.W.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ZBUD.

CZ. UZUPEŁNIENIE MUUR OGRODZENIA I ODNOWIONE BRAMKI 1956

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

V. 1967 STAN DOBRY

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

25. Rejestr zabytku Nr

184

20.04.1970

rok miejsce przechowywania


26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

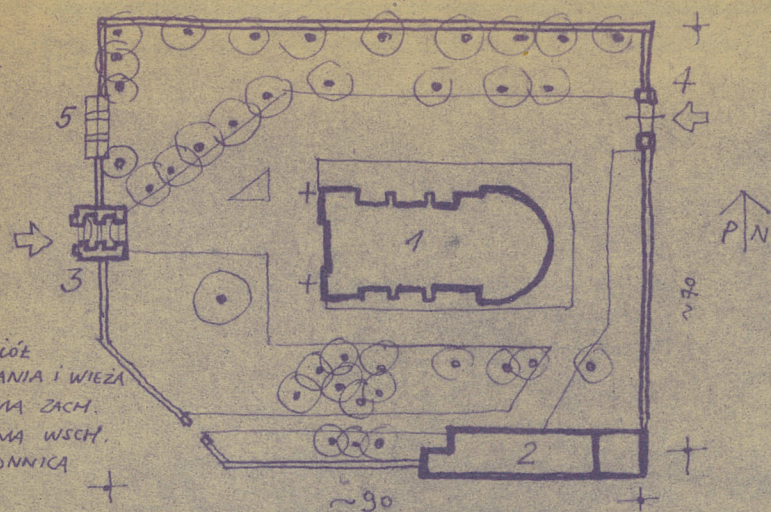

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible]

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste
		34. Inspekcje 2 poz 8 cd
		KOLEBKĄ. PO BOKACH WEWNĄTRZ
		SEGMENTOWE WNEKI Z KAMIENNY-
		MU TAWANU, SZCZYT TRÓJKĄTNY,
		Z BELKOWANIEM WSPARTYM NA
		PILASTRACH FLANKUJĄCYCH WEJŚCIE.
		W ZWIĘŻENIU KRZYŻ KAMIEN-
		NY. PO BOKACH KULE KAMIENNE
		NA IMPOSTACH.



6. Wypełnił dnia v. 1964

.Kalia
 .Lycopodium

37. Sprawdził dnia
