

1. Obiekt zabytkowy

6/1 Kościół w. M.P. a) Kościół p.w. Wniebowstania Najp. Marii Panny.

2. Miejscowość

Wardawa
Przyrynek 2

3. Wiek

XV/XVIII/XIX

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³

14.000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: — b) użytkowa: 775m²

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

cegła

cegła

c) stropy

—

—

d) więzania dachu

drewn.

drewn.

e) krycie dachu

ceram. blacha

ceram. blacha

12. Ilość kondygnacji

(zakrypta - 2 kond.) 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń: nam., prebiterium, 2 kaplice, 2 pomieszczenia zakrypte

c) piwnic (garaż)

a) ogrody stylowe

7

b) sady i grunty uprawne

7

c) lasy

7

d) wody

7

e) inne

7

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Parafia w. M.P.

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

J.W.

25. Rejestr zabytku Nr

449 x

rok

1948

2 11.07.1965

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

—

27. Nr hipoteczny

1882

28. Akta

UK-449a

29. Fotografie

PIS, UK

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Pracowni Inżynierów Budowlanych
Zakł. Arch. Państw. P.W.

8. Wyposażenie architektoniczne

muszki schodkowe. W murze frontowym widoczna podłoga. Portal z kolumnadek wewnątrz sklepienia żebrowe. Kaplica: łuki łukowe, hcm.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1409 r. Przebudowy: 1429, 1479, 1730, 1883

1492-1497 r. pot. XVII r. przebud. na bazylikę, 2 pot. XIX r. przebud., częściowo rekonstr.

10. Udostępnienie


Matr.

Matr. po 1411, 2 pot. XV, przebud. 2 pot. XVI, 1 pot. XVII, 1759-78, rekonstr. 1821-28, Matry. Synodalna, 1826-41, 1851-56

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	zburzony	70	
1959	w odbudowie	20	80

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

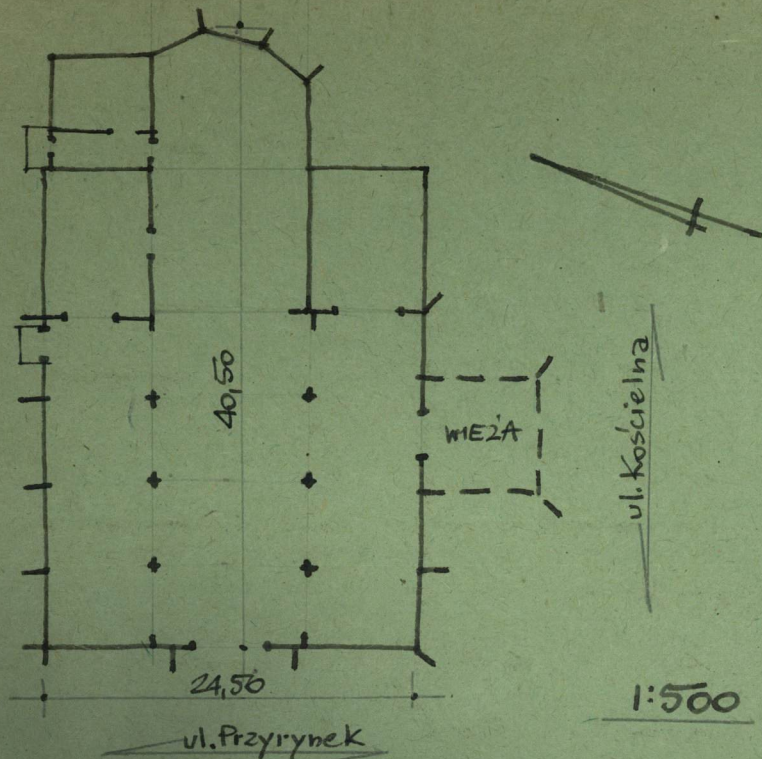

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XII. 1958r.

Michalski

37. Sprawdził dnia

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER-ARCHITECT

15. 1958

14. 1958



Kościół wolnostojący, 3 nawa-
wy barylikowy, z wieżą
przystawianą do elewacji
południowej. Przy preb-
terium kaplice i zakrystia.
