

1. Obiekt zabytkowy
CERKIEW p.w. Wprowadzenia do świątyni Prześw. Bogarodzicy ob. kościoła par. Narodzenia NMP

2. Miejscowość
KROŚCIENKO-WOLICA KROŚNIENSKIE USTRZYKI POLSKA

3. Wiek
XVIII ?

4. Styl
budownictwo ludowe

5. Kubatura m³
~ 650

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa: ~ 160

7. Materiał budowlany

11. Ilość budynków
1

12. Ilość kondygnacji
1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych
b) innych pomieszczeń
c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:
a) ogrody stylowe
b) sady i grunty uprawne
c) lasy
d) wody
e) inne

20. Przynależność administracyjna
a) województwo
b) powiat
c) gmina

21. Stacja
Nazwa stacji
Odległość od stacji w km

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
cerkiew filialna gr.-kat.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych
p.w.

17. Użytkowanie obecne
kino, świetlica ob. nie użytkowane

18. Nadaje się do użycia na
p.w.

23. Użytkownik i jego adres
w Kroszczynie
ob. nie użytkowane

24. Inwestor i jego adres
w Kroszczynie
Zarząd Spółdzielni

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Schematyzm podaje datę przebudowy r. 1901. Adaptacja na kino nastąpiła po r. 1955.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr
rok
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej
27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie
blues u kierownika poczty w Kroszczynie

XI. 1960. stan dobry - budynek adaptowany w sposób niezbyt zgodny z zasadami konserw.




Ustawiona na wzgórzu,
przy skrzyżowaniu dróg,
orientowana. Na podmu-
rowie z kamienia łamanego
na zaprawie wapiennej.
Drewniana, konstrukcji
wieńcowej. Przedsiönek
konstrukcji słupowej. Ścia-
ny onalowane pionowo deskami z listewkami. Przedsiö-
nek dity pępek. Podmurowie osłonięte słowicie umoco-
wane deski, dręgięca, cały łodynek. Ściany zewnętrzne
pionowa deska, wyjęta od dołu w archadzie. Dęty sió-
towe, dwuspadowe; nad częścią najpiękniejszą dach trójpa-
dowy. Słup stalowy pionowo deskami.

Budynki podczas adaptacji znacznie uciężniał. Całko-
wnie zmieniono strop, wymieniono stolarkę drzwi
i okien. Zwiększono dobudowano koniny, oraz schodki
do haliny operatora.

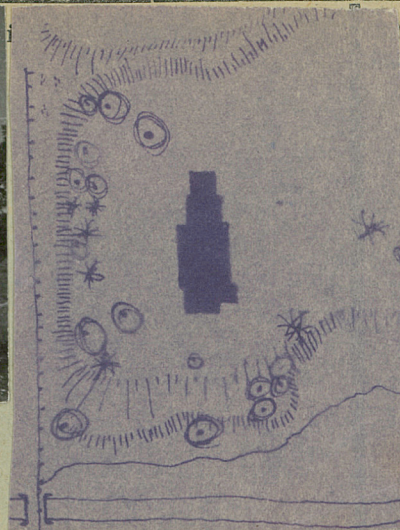

Rzeczbieg prac konserwatorskich Do momentu wykonania świadectwa
konserwatorskich nie prowadzono.

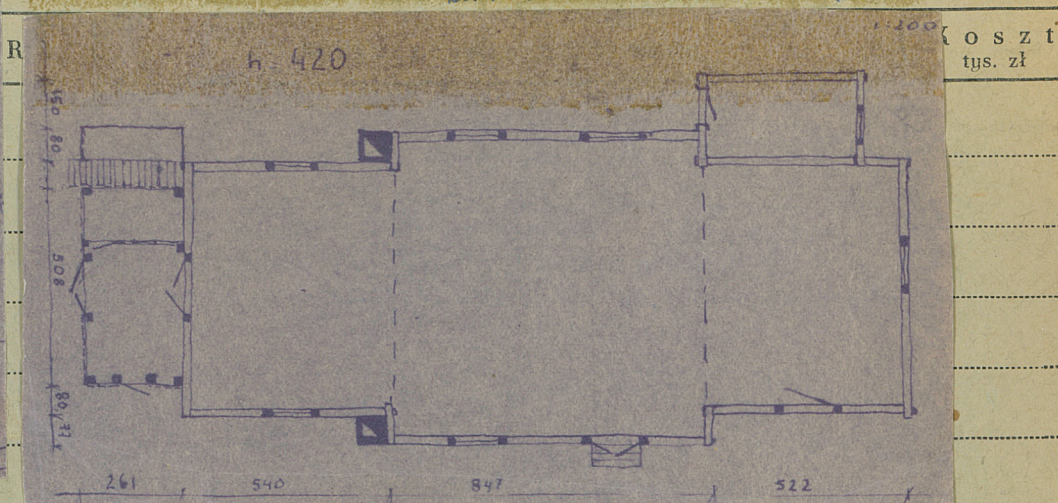

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34. Inspekcje
			11. X. 1960. B. Tondos (W.K.Z.)

35. Uwagi różne	36. Wypełnił dnia 30. XI. 1960. /B. Tondos/ B. Tondos
	37. Sprawdził dnia
