

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

pałac murowany wypalony

2. Miejscowość

Nowodwory

gm. CIECHANOWIEC

3. Wiek

XIX

4. Styl

Klasycyzyczny

5. Kubatura m<sup>3</sup>

8500

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 822.8 b) użytkowa: 822.8

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewniane

d) wiązania dachu

drewniane

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

1 i 2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych 25

b) innych pomieszczeń 6

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

całkow.

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Białystok

b) powiat Siemiatycki

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Czyżewo

18.

b) autobusowa

Ciechanowiec

1.

22. Właściciel i jego adres

P. M. R. N. w Ciechanowcu pow. Siemiatycki

23. Użytkownik i jego adres

nie użytkownik

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

wewnątrz pałacu zostało strawione przez pożar pozostało na fasadach w stanie pochłoniętych

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

cele społeczno kulturalne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Autor murem budowa z XIX w.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

zamieszkały

XI.1939 r.

XII.1945 r.

wypalony pozostały tylko mury

65

25. Rejestr zabytku Nr

29-Kult.V.26.17-53.

rok 1915.

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

W.K-2 Białystok


30. Inwentaryzacja pomiarowa

W.K-2 Białystok



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

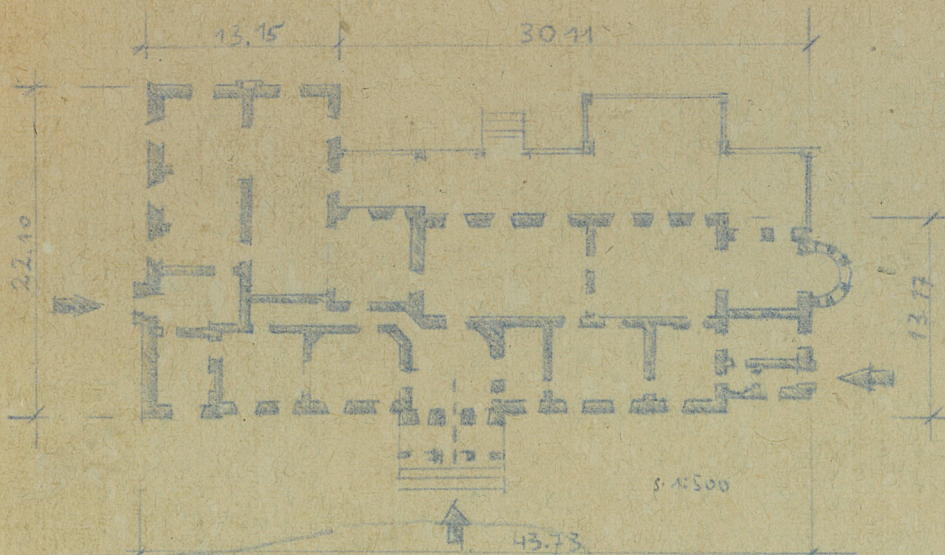

32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok  | Wyszczególnienie prac                  | K o s z t<br>tys. zł |
|------|--|----------------------|
| 1962 | całkowicie odgruzowany i wyremontowany |                      |
|      |  |                      |
|      |  |                      |
|      |  |                      |
|      |  |                      |
|      |  |                      |
|      |  |                      |

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 2.450 |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |
|  |       |  |

35. Uwagi różne

Stan techniczny murów  
jest b. dobry

36. Wypełnił dnia 11.I 1962r

*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Krawczyk

37. Sprawdził dnia
