

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

POMORSKIE

7912

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica, LAWENDOWA**1 II**

2. Miejscowość

MIASTO**GDAŃSK - GŁ.M.**3. Wiek
XVII4. Styl
Renesans5. Kubatura m³
14006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: **116** b) użytkowa: **116**

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **gdańskie**b) powiat **"**c) gmina **-**

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

piwn. cegła

c) stropy

drewn.

d) wiązania dachu

drewn.

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

9

b) innych pomieszczeń

11

c) piwnic

3

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Gdańsk**1**

b) autobusowa

Gdańsk**1**

22. Właściciel i jego adres

MRN Gdańsk

23. Użytkownik i jego adres

nieużytkowany

24. Inwestor i jego adres

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

bud. ok. 1620 r.**1962/63 remont konserwatywny****XVIII/XIX w. prebud. wnętrza**

10. Udostępnienie

dostępny

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

opuszczony przez mieszkańców

18. Nadaje się do użycia na

mieszkania

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI.1959

niezniszczony**uszkodzony - wyboczenie części ścian zewnętrznych, częściowe zniszczenie stropów, konstr. dachowej oraz schodów, zniszcz. wyposaż. wnętrza i ścian działowych.****40%**

25. Rejestr zabytku Nr

96rok **15.02.1960**

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

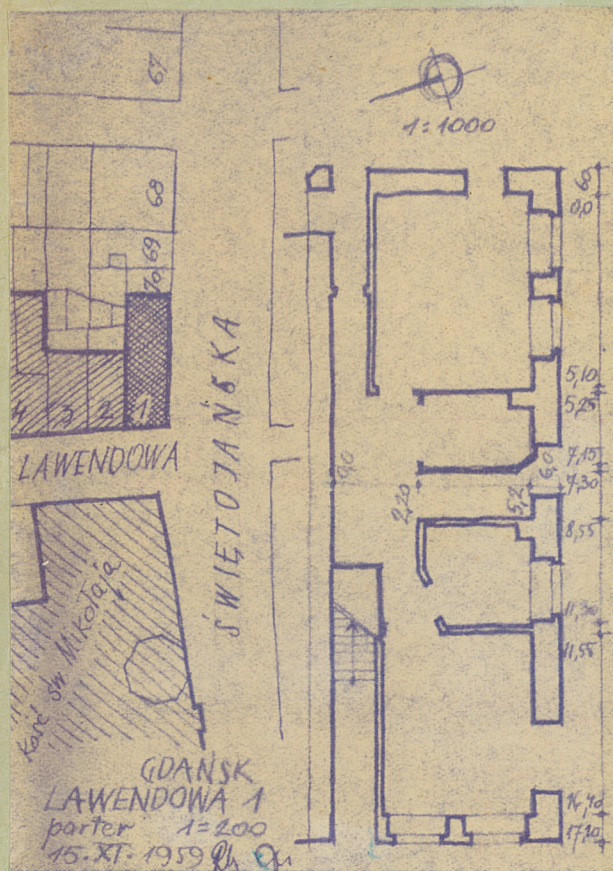

rysunek elew. frontowej



elew. frontowa.



elew. tylna.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Odbudowana na zmienionym murze.
 Stychylenie z pionu ściany muru, zostało
 zrehabilitowane przez postawienie trzech wzm.
 ścian poprzecznych i założeniu opasek
 żelbetowych między każdą kondygnacją.

36. Wypełnił dnia 15. XI. 1959
 R. Marzabini

37. Sprawdził dnia
 XI. 1965 Altruściński
