

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół fil. pw. Podwiesienia Krzyża św.
CHRYSOSTUSA KRÓLA

2. Miejscowość

Wielin ^{gm Polanów}

3. Wiek

XVII

4. Styl

-

5. Kubatura m³

650

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 117 b) użytkowa: 117

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

drewno
głina

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

- u -

e) krycie dachu

gout

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne ewent. kości.

1/4

8. Wyposażenie architektoniczne

nie ma

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- " -

17. Użytkowanie obecne

- " -

18. Nadaje się do użycia na

- " -

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1689 - datowany
1914 - restauracja

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

wzmianasy

XI.1939 r.

- " -

XII.1945 r.

- " -

VII.1959

konieczne naprawy pokrycia

20

VIII.1963

dach
Stan dobry - pokrycie dachu wymienione
w 1961r., podwalina w 1963r.

10. Udostępnienie

dostępny

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ^{WPS} kassalińskie

b) powiat starin'ski

c) gmina Polanów

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Ciecholub

8

b) autobusowa

Polanów

6

22. Właściciel i jego adres

per. rym. - kat. Polanów

23. Użytkownik i jego adres

- " -

- " -

- " -

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

397

rok 26.10.64

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

HK2 Romanin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

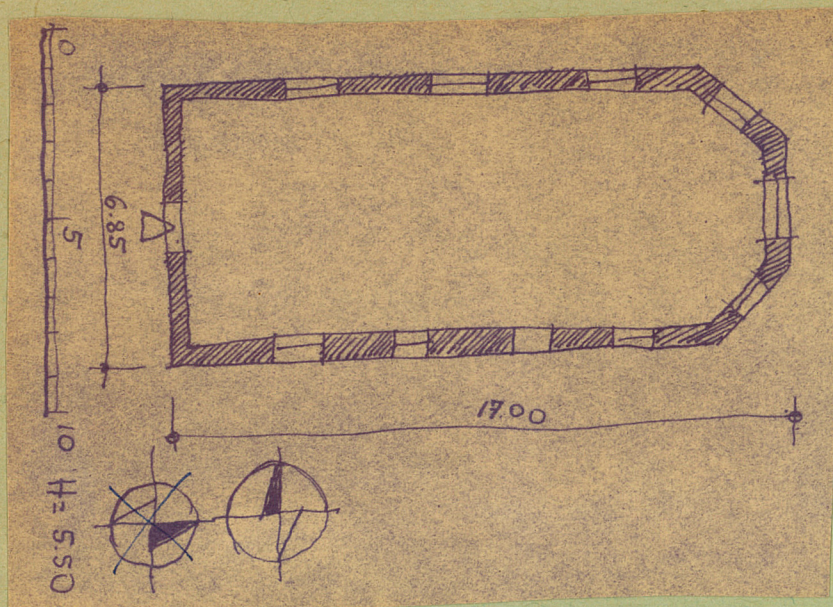

Kościół orientowany konstrukcji ryglowej wypełnionej cegłą tykowaną - elewacja zach. muryrowana. Salony zamknięte trójbocznie z wieżyczką od zach. wstępującą w nawę. Nawę otacza strop. Dach dwuspadowy kryty dachówką, wieża ostrospadowa kryta gontem.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia:

K. Mellin, J. Sierant - Koscioł
log zabudowany pow. słowno
/mapy/ 1959 r.)

36. Wypełnił dnia 4.11.1963.

Teresa Sierant

37. Sprawdził dnia 25.11.1963 r.

mgr Stanisław Ptarmakowski
INŻ. FELIKS PTARMAKOWSKI
